VALE	Sotreq CAT	CLASSIFICAÇÃO **USO INTERNO**	**EXPANSÃO DOS CAMINHÕES AUTÔNOMOS** **SE-KN-2025-5062**

PROJETO DETALHADO **CARAJÁS GERAL** **EXPANSÃO DOS CAMINHÕES AUTÔNOMOS** **IMPLANTAÇÃO EMBARCADOS** **CHECKLIST DE ENTREGA – CAMINHONETE (CT4954)** **RELATÓRIO TÉCNICO**	Nº VALE	PÁGINA **1/20**
	Nº (CONTRATADA) **-**	REV. **0**

REVISÕES

TE: TIPO EMISSÃO — A - PRELIMINAR; B - PARA APROVAÇÃO; C - PARA CONHECIMENTO; D - PARA COTAÇÃO; E - PARA CONSTRUÇÃO; F - CONFORME COMPRADO; G - CONFORME CONSTRUÍDO; H - CANCELADO

Rev.	TE	Descrição	Por	Ver.	Apr.	Aut.	Data
0	C	PARA CONHECIMENTO	AL	VDR	AC	AC	30/09/26

ÍNDICE

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA
1.0	ORIGEM DA DEMANDA	3
2.0	OBJETIVO	3
3.0	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	3
4.0	CÓDIGOS E NORMAS	4
5.0	EQUIPAMENTO	4
6.0	PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA FLEET ONBOARD PARA AOZ 4	
7.0	STATUS DO ATIVO ANTES DA INSTALAÇÃO DO KIT	7
8.0	CHECKLIST DOS COMPONENTES DO SISTEMA FLEET	7
9.0	CHECKLIST DA INSTALAÇÃO	8
9.1	PAINEL FLEET – G407	8
9.2	INSTALAÇÃO GNSS	9
9.3	INSTALAÇÃO DOS CHICOTES	10
10.0	COMISSIONAMENTO	11
11.0	CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA FLEET	13
12.0	CONCLUSÃO	15

1.0 ORIGEM DA DEMANDA

Implantação do sistema Cat® MineStar Fleet nas caminhonetes de serviço com acesso à AOZ da mina de Carajás-PA, em atendimento ao projeto PRJ0049069 – CKS – Expansão dos Caminhões Autônomos. A demanda contempla a preparação do ativo para integração ao ambiente de mina autônoma, considerando a instalação embarcada, a conectividade, o posicionamento GNSS e a configuração operacional no Fleet.

2.0 OBJETIVO

Apresentar o checklist de conversão da caminhonete de serviço CT_SCA_G450_XT – CT4954, com os componentes necessários para atuação em operação de mina autônoma.



Figura 2.1 – Caminhonete de serviço.

3.0 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os documentos relacionados foram utilizados na elaboração deste documento ou contêm instruções e procedimentos aplicáveis a ele. Devem ser utilizados na sua revisão mais recente.

CP-J-507	Critérios de Projetos para Sistemas de Automação de Mina
PR-E-019	Formatação de Documentos Word
UENR6985-25	Cat® Fleet G407 Onboard Configuration Guide.
M0087361-12	Procedure for Installing and Configuring Cat® MineStar™ System Onboard for AOZ Access and HP Cat Fleet On-Board

4.0 CÓDIGOS E NORMAS

Os códigos e/ou normas relacionados foram utilizados na elaboração deste documento ou contêm instruções e procedimentos aplicáveis a ele. Devem ser utilizados na sua revisão mais recente.

NBR 5410:2008	Instalações Elétricas de Baixa Tensão
PNR-000131	Sistemas Elétricos – Geral – Painéis Elétricos

5.0 EQUIPAMENTO

Este checklist de entrega foi elaborado por Fernando Arruda, colaborador da Sotreq/CAT, para a instalação do kit Fleet no seguinte equipamento:

Tabela 5.1 – Dados da instalação.

Modelo	Caminhão pipa
Série/TAG	CT4954
Data de início da instalação	25/09/2026
Data de conclusão da instalação	27/09/2026
Data de comissionamento	29/09/2026

6.0 PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA FLEET ONBOARD PARA AOZ

O procedimento de instalação do sistema Fleet Onboard para operação em AOZ contempla a integração dos componentes responsáveis pela alimentação elétrica, comunicação embarcada, posicionamento GNSS, interface operacional e transferência de dados com o ambiente MineStar. A instalação deve garantir a correta fixação dos módulos, a proteção dos chicotes, o aterramento, a conectividade com a infraestrutura de rede e a disponibilidade dos recursos necessários ao rastreamento do ativo.

Conforme apresentado na Figura 6.1, a arquitetura embarcada integra antena GNSS, receptor GNSS, display G407, terminais de serviço, relé de alimentação, chave de aterramento e alimentação dedicada ao rádio do cliente. Essa configuração permite o envio e recebimento de informações operacionais, a aplicação de correções GNSS quando disponíveis e a representação do equipamento no sistema Fleet.

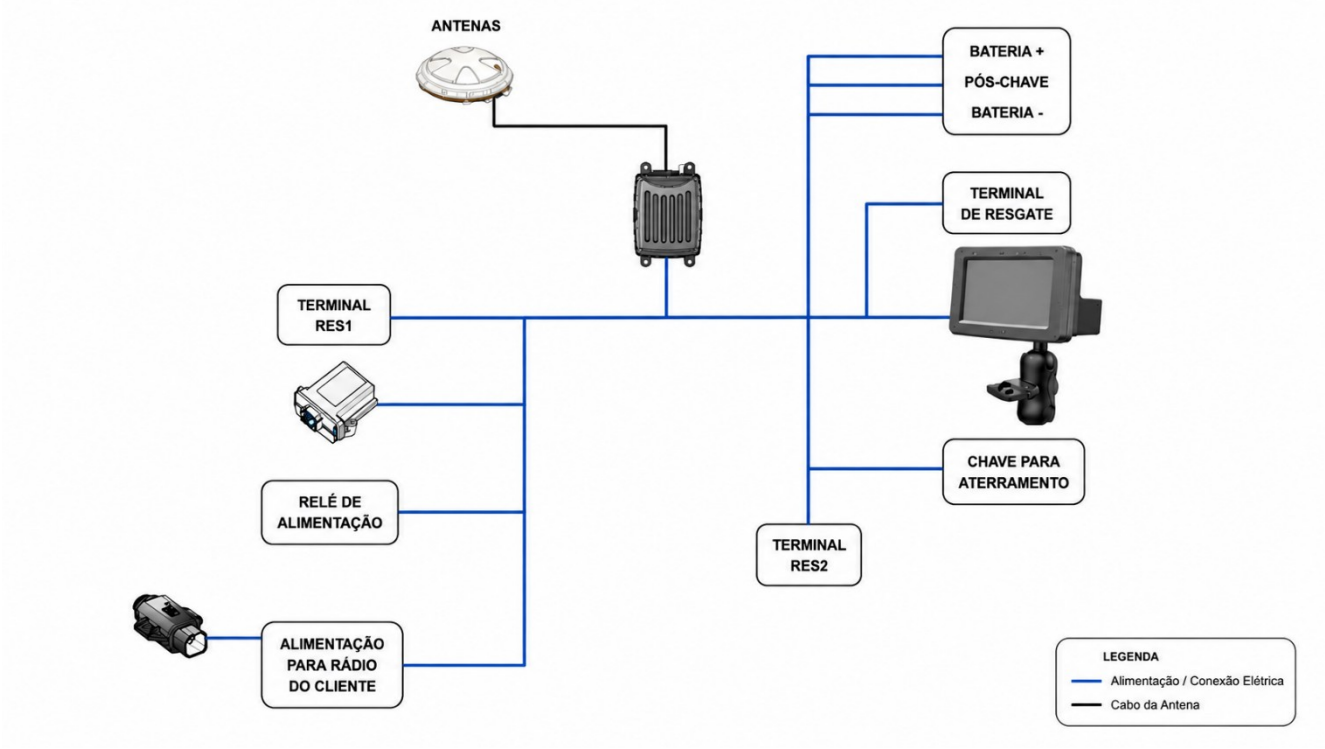


Figura 6.1 – Arquitetura do sistema embarcado Fleet.

A alimentação elétrica do sistema é realizada por meio das conexões de bateria positiva, bateria negativa e pós-chave, garantindo acionamento controlado dos componentes embarcados e proteção do circuito durante a operação do equipamento.

O circuito contempla relé de alimentação, terminais de conexão e alimentação dedicada para o rádio do cliente, responsável pela comunicação do equipamento com a infraestrutura sem fio da mina. Para aplicações Fleet, a conectividade deve permitir a troca de dados entre o ativo, o servidor MineStar e os serviços de posicionamento do site.

O sistema possui chave de aterramento e terminais de serviço utilizados para suporte operacional, diagnóstico e manutenção. O chicote deve ser instalado respeitando critérios de roteamento, fixação, proteção mecânica, afastamento de fontes de calor, ausência de pontos de atrito e alívio de tensão próximo aos conectores, preservando a integridade elétrica e a disponibilidade do sistema Fleet Onboard.

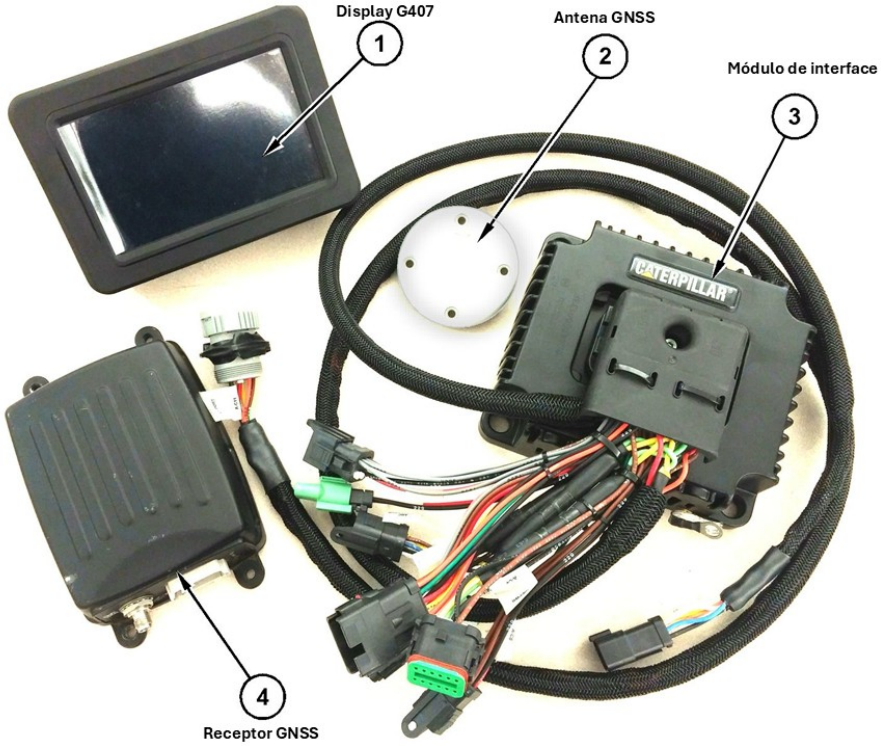


Figura 6.2 – Componentes embarcados.

7.0 STATUS DO ATIVO ANTES DA INSTALAÇÃO DO KIT

Foi realizada avaliação inicial do ativo para levantamento das condições necessárias à execução das atividades, não sendo identificados impedimentos técnicos para atuação no equipamento.



Figura 7.1 – Condição do ativo antes da instalação do kit Fleet.

8.0 CHECKLIST DOS COMPONENTES DO SISTEMA FLEET

Este item apresenta o checklist dos componentes que integram o sistema Fleet para caminhonetes de serviço, contemplando os principais componentes, acessórios e dispositivos necessários à correta instalação, operação e confiabilidade do sistema.

Tabela 8.1 – Lista de peças.

Número de peça	Quantidade	Descrição
598-2192	1	Conjunto de Receptor GNSS
639-8004	1	Display G407 – Interface Fleet Onboard

Tabela 8.2 – Relação de PNs dos implementos e acessórios de montagem.

Subsistema	PN	Descrição	Aplicação / Observação
Fleet Onboard	639-8004	Display G407	Interface operacional do sistema Fleet embarcado
GNSS	598-2192	Receptor GNSS	Conjunto de antenas GNSS
Kit AOZ	557-9117	Grupo de instalação de comunicação / grupo base de acesso à AOZ	Grupo base de instalação e comunicação para acesso à AOZ.
Fixação	3S-2093	Cable Strap / Abraçadeira	Item de fixação e organização dos chicotes do kit AOZ.
Proteção mecânica	343-8460	Conduit / Conduíte	Item de proteção mecânica para roteamento e passagem dos cabos.
Vedação/passagem	2D-0388	Grommet / Passa-cabo	Item de vedação e passagem de chicotes/cabos na instalação.
Conexão elétrica	3E-3370	Connector Receptacle As	Conector elétrico do kit AOZ.

Subsistema	PN	Descrição	Aplicação / Observação
Comunicação	424-0876	Cable As / Conjunto de Cabo	Cabo de comunicação do sistema Fleet/AOZ.
Suporte	551-0846	Bracket As / Conjunto de Suporte	Conjunto de suporte do kit AOZ.
Chicote LV	549-6793	Wiring Harness / Chicote Elétrico	Chicote principal do grupo de veículo leve 12 V.

9.0 CHECKLIST DA INSTALAÇÃO

Este item apresenta o checklist de instalação do sistema Fleet, contendo as verificações realizadas nos componentes instalados, com foco na fixação, na condição dos cabeamentos e conectores, nos chicotes e na proteção dos pontos de montagem.

9.1 PAINEL FLEET – G407

Os equipamentos que utilizam o sistema Cat® Fleet embarcado são equipados com o display G407, utilizado como interface operacional entre o operador e o sistema onboard. O display permite a visualização das informações operacionais do equipamento, inserção de dados e acompanhamento da condição do ativo no ambiente MineStar.

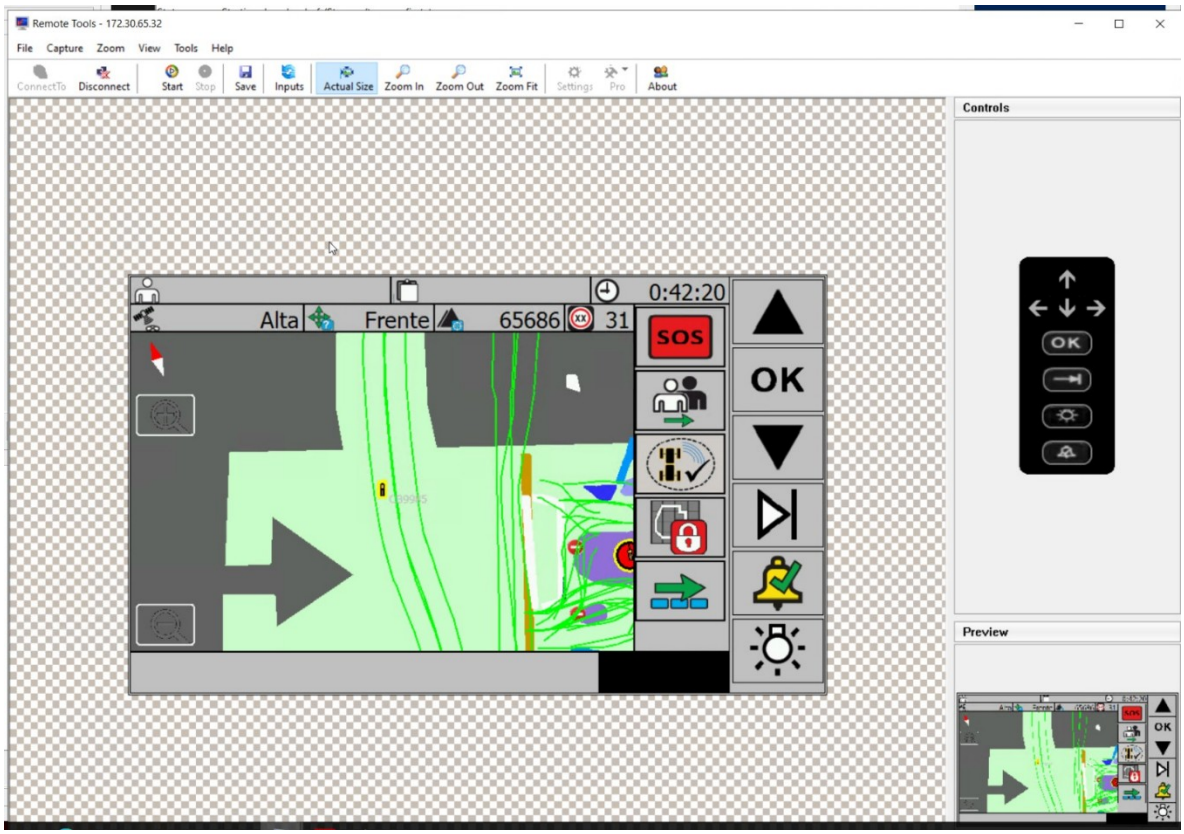


Figura 9.1 – Interface operacional do display G407.

Além da interface operacional, o display G407 executa a aplicação MineStar Fleet/Site Awareness embarcada (Onboard) e serviços associados ao monitoramento, comunicação, gerenciamento de arquivos, suporte e diagnóstico. A verificação técnica considera a instalação ou atualização do sistema operacional, instalação do software Fleet, seleção do arquivo de aplicação correto, configuração dos parâmetros locais e validação da comunicação com o servidor MineStar.



Figura 9.2 – Painel do Fleet instalado na caminhonete.

Tabela 9.1 – Checklist da instalação.

Item	Condição	Observações
Verificar a fixação do suporte do painel	OK	
Verificar a condição dos cabeamentos	OK	
Verificar a condição dos conectores	OK	
Verificar a fixação dos chicotes	OK	

9.2 INSTALAÇÃO GNSS

O kit de instalação do sistema Cat® Fleet na caminhonete de serviço integra o receptor e a antena GNSS para obtenção das informações de posicionamento do ativo. A instalação deve garantir fixação adequada, proteção do receptor, integridade dos conectores, roteamento correto dos cabos e posicionamento da antena em local com menor interferência possível, favorecendo a recepção dos sinais de satélite através de uma visada livre para a atmosfera. As correções RTK disponibilizadas pela infraestrutura da mina chegam ao receptor através da estrutura de rede da mina.



Figura 9.3 – Antena GNSS.

Tabela 9.2 – Checklist da instalação.

Item	Condição	Observações
Verificar a fixação do suporte do GNSS	OK	
Verificar a fixação do GNSS	OK	

Item	Condição	Observações
Verificar a instalação dos chicotes do GNSS	OK	

9.3 INSTALAÇÃO DOS CHICOTES

A instalação dos chicotes elétricos deve garantir o correto roteamento ao longo da estrutura do equipamento, assegurando organização, proteção mecânica e funcionalidade do sistema. Os chicotes devem ser fixados em pontos apropriados de ancoragem, sem criar risco de interferência com comandos, pedais, painéis, elementos móveis, áreas de manutenção ou superfícies cortantes.

Também deve ser assegurado que os chicotes estejam protegidos contra atrito, vibração, esmagamento, contato com superfícies aquecidas e esforço mecânico nos conectores. A fixação deve reduzir tensão nos terminais e preservar a continuidade elétrica do sistema durante a operação do equipamento.



Figura 9.4 – Chicotes instalados.

Tabela 9.3 – Checklist da instalação.

Item	Condição	Observações
Verificar o roteamento dos chicotes	OK	
Verificar a fixação dos chicotes	OK	
Verificar os pontos de atrito	OK	

10.0 COMISSIONAMENTO

No dia 29/09/2026, foi realizado o comissionamento da Caminhonete CT4954 no sistema Cat® MineStar Fleet, contemplando o cadastro do equipamento, a configuração dos parâmetros operacionais e a validação das condições necessárias para sua integração ao sistema de despacho da mina autônoma.

Durante a atividade, foram configuradas as informações de identificação do equipamento, incluindo nome operacional, número de série, descrição e associação à classe operacional correspondente. Também foram verificados os parâmetros do sistema embarcado, endereço IP, comunicação com o servidor, configuração GNSS, aplicação do arquivo de configuração aplicável e validação do posicionamento, garantindo a correta comunicação, rastreamento e representação no ambiente Fleet.

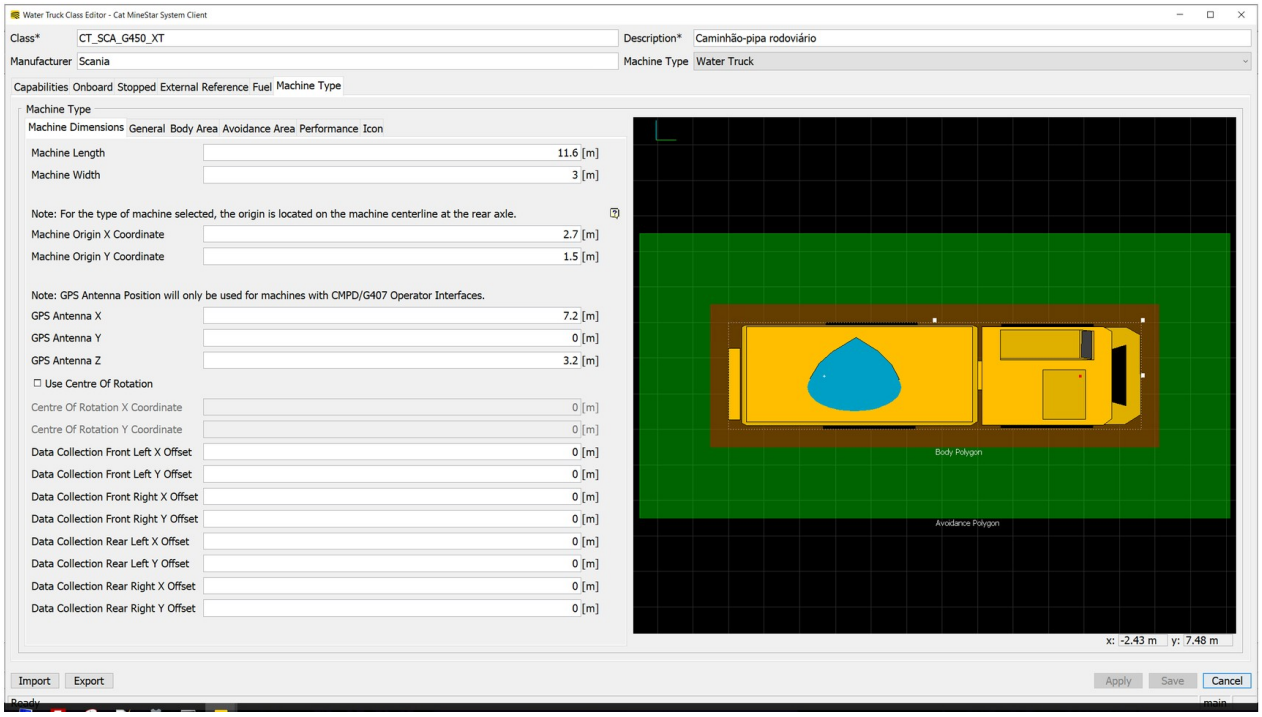


Figura 10.1 – Cadastro da classe do equipamento no MineStar Fleet.

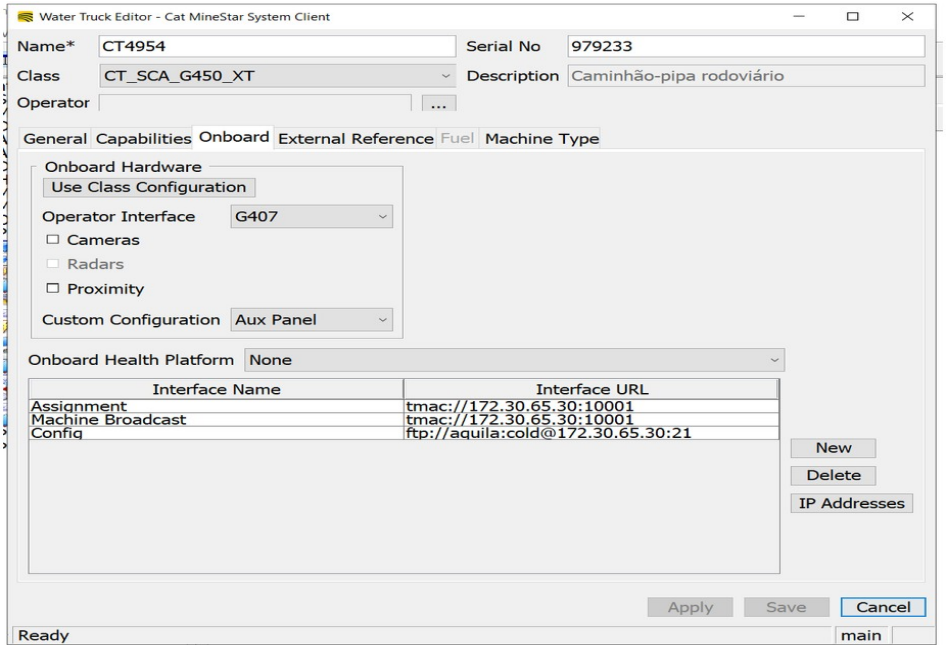


Figura 10.2 – Configuração do sistema embarcado.

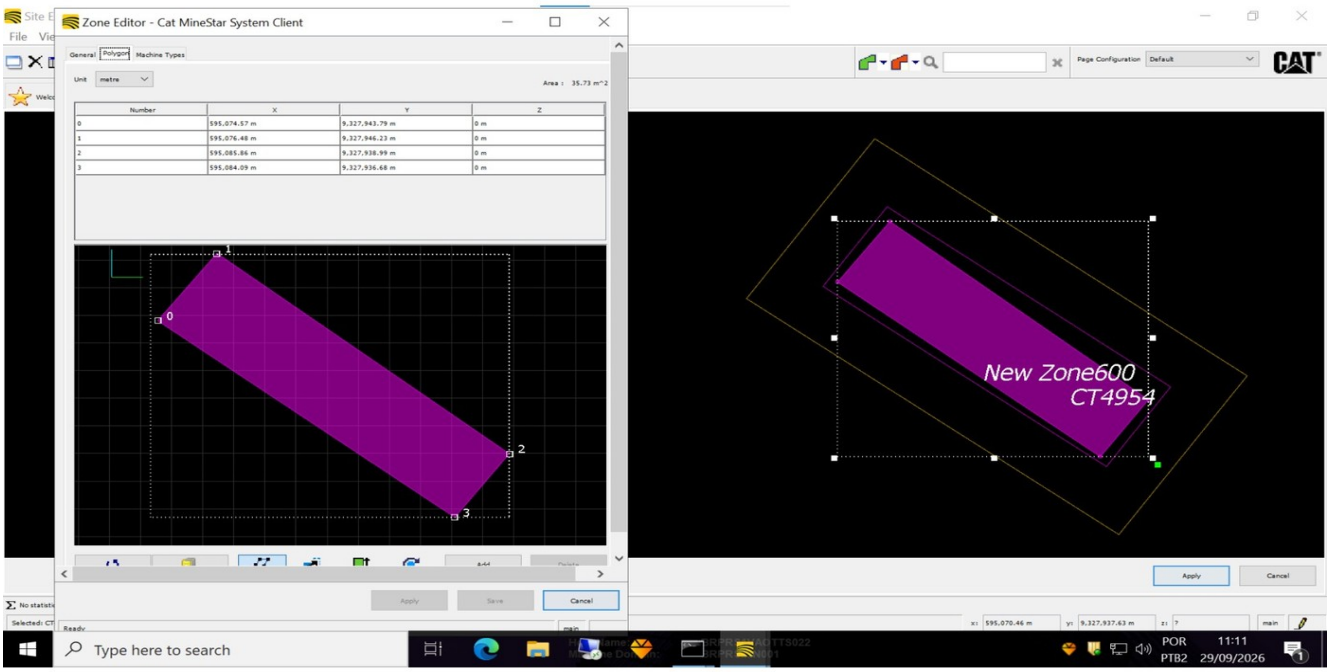


Figura 10.3– Caminhonete comissionada.

11.0 CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA FLEET

A tabela a seguir apresenta os itens de configuração avaliados durante o comissionamento, suas respectivas condições e observações.

Tabela 11.1 – Checklist geral de configuração do sistema Fleet.

Item	Configurações do sistema Fleet	Condição	Observações
1	Criação do equipamento no Fleet Office	OK	Cadastro realizado
2	Associação à classe operacional e modelo do equipamento	OK	Classe configurada
3	Instalação/atualização do sistema operacional do G407	OK	Versão validada
4	Instalação do software MineStar Fleet Onboard	OK	Aplicação instalada
5	Instalação/verificação do firmware do receptor GNSS	OK	Firmware verificado
6	Configuração do endereço IP do Fleet	OK	Endereçamento configurado
7	Teste de conexão com o servidor MineStar	OK	Comunicação validada
8	Configuração GNSS / APP file	OK	Arquivo aplicado
9	Verificação de alimentação elétrica do sistema	OK	Positivo, negativo, pós-chave e aterramento verificados.
10	Teste de inicialização do display G407	OK	Interface operacional carregada sem falhas aparentes.
11	Teste de comunicação com rádio/rede da mina	OK	Comunicação validada para integração com servidor Fleet.
12	Medição e validação de posicionamento	OK	Posicionamento validado
13	Validação de acessórios, cabos e itens de fixação	OK	Validação de acessórios, cabos e itens de fixação
14	Registro das evidências de instalação	OK	Painel, GNSS, componentes embarcados e chicotes

Sotreq CAT — CHECK LIST - MINESTAR FLEET - CONFIGURAÇÃO E COMISSIONAMENTO

DADOS GERAIS

TAG: CT 4954
Fabricante: Scania
Modelo: G450-XT
Produto(s) instalado(s): FLEET/SITE AWARENESS
Data: 29/09/2026

	ITENS DO COMISSIONAMENTO	SIM	NÃO	N.A.	OBSERVAÇÕES
CADASTRO MINESTAR	Cadastrar classe do ativo	☑	☐	☐	
	Inserir dados de medidas	☑	☐	☐	
	Adicionar ativo	☑	☐	☐	
	Inserir dados de comunicação IPs e portas	☑	☐	☐	
SISTEMA EMBARCADO	Atualizar SO do display/módulo principal	☑	☐	☐	
	Atualizar software do display/módulo principal	☑	☐	☐	
	Atualizar firmware do(s) receptor(es) GNSS	☑	☐	☐	
	Upload do arquivo de calibração GNSS (AppFile)	☑	☐	☐	
	Inserir dados de configuração	☑	☐	☐	
	Inserir dados de comunicação IPs e portas	☑	☐	☐	
MEDIÇÕES	Realizar medições gerais	☑	☐	☐	
	Realizar medições dos pontos de coleta de dados	☐	☐	☑	
COMISSIONAMENTO	Validar comunicação com o servidor	☑	☐	☐	
	Validar recebimento de correções (alta precisão GNSS)	☑	☐	☐	
	Verificar funcionamento sinal de ré	☑	☐	☐	
	Validação de posicionamento (box test)	☑	☐	☐	

Assinatura responsável técnico / Nome

Figura 11.1 – Checklist de comissionamento assinado.

12.0 CONCLUSÃO

Com base nas verificações realizadas, constata-se que os componentes do sistema Fleet instalados na caminhonete foram conferidos e encontram-se compatíveis com o escopo de montagem, incluindo display G407, receptor/antena GNSS, chicotes, cabos, e demais acessórios relacionados neste relatório.

As configurações e testes do sistema foram concluídos com sucesso. As etapas relacionadas à instalação/atualização do sistema operacional do G407, instalação do software MineStar Fleet, verificação do firmware do receptor GNSS, configuração de IP, teste de conexão com o servidor, aplicação dos parâmetros do ativo e validação de posicionamento foram executadas sem identificação de não conformidades.
